

हरियाली प्रोजेक्ट

माह मार्च 2010



क्र.	स्वीकृत प्रस्ताव		स्वीकृत मिली वाटरशेड का नाम	माइक्रो वाटर शेड की संख्या	केन्द्र शासन से प्राप्त राशि	राज्य शासन से प्राप्त राशि	अन्य प्राप्ति (ब्याज)	कुल प्राप्त आवंटन (योग)	वर्ष	जनपद पंचायत का नाम
	भौतिक (हेक्टे.)	वित्तीय (लाख)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	3869	232.14	काली किराय 2D2B2C	8	33.00	3.00	0.19	36.19	2004-05	डॉ० अम्बेडकर नगर
			कुवाली 2D4D7A	3	62.57	5.62	0.446	68.636	2005-06	डॉ० अम्बेडकर नगर
							0.294	0.294	2006-07	
					62.39	5.67	0.635	68.70	2007-08	
					53.25	5.01	1.134	59.39	2008-09	

वित्तीय प्रगति

भौतिक प्रगति (हेक्टे. में)

1.04.09 को शेष	केन्द्र से प्राप्त	राज्य से प्राप्त	अन्य प्राप्ति	योग	व्यय राशि	शेष राशि
32.14	0.00	0.00	0.00	32.14	30.650	1.49

उपचार हेतु लक्ष्य हेक्टे.	उपचार हेतु लक्ष्य हेक्टे.
3869	3869

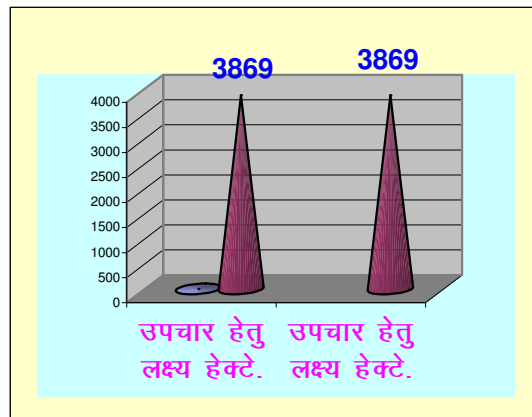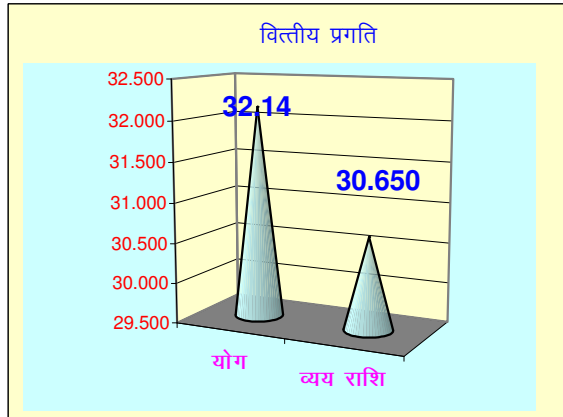

एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (हरियाली प्रोजेक्ट) – कार्यवार प्रगति

क्र.	विवरण	यूनिट	संख्या
1	वृक्षारोपण	हेक्टयर	45
2	जैट्रोफा	हेक्टयर	488
3	आर.एम.एस.(पक्का नाला बंधान)	—	110
4	फार्म पौण्ड	—	37
5	गेबियन	—	1
6	कुआं रिचार्ज	—	13
7	स्व सहायता समूह	—	24
8	वर्मी कम्पोस्ट	—	71
